

PROJECT MANAGEMENT

ARCHITECTURE & DELIVERY PORTFOLIO

張愷芯 Amber Chang

把複雜工程、採購、成本與交付資訊，
轉成可執行、可追蹤、
可決策的管理架構。

7+ 年


跨產業專案

NT\$4M+

單案成本改善

3 類場域


零售· MEP· 自動化

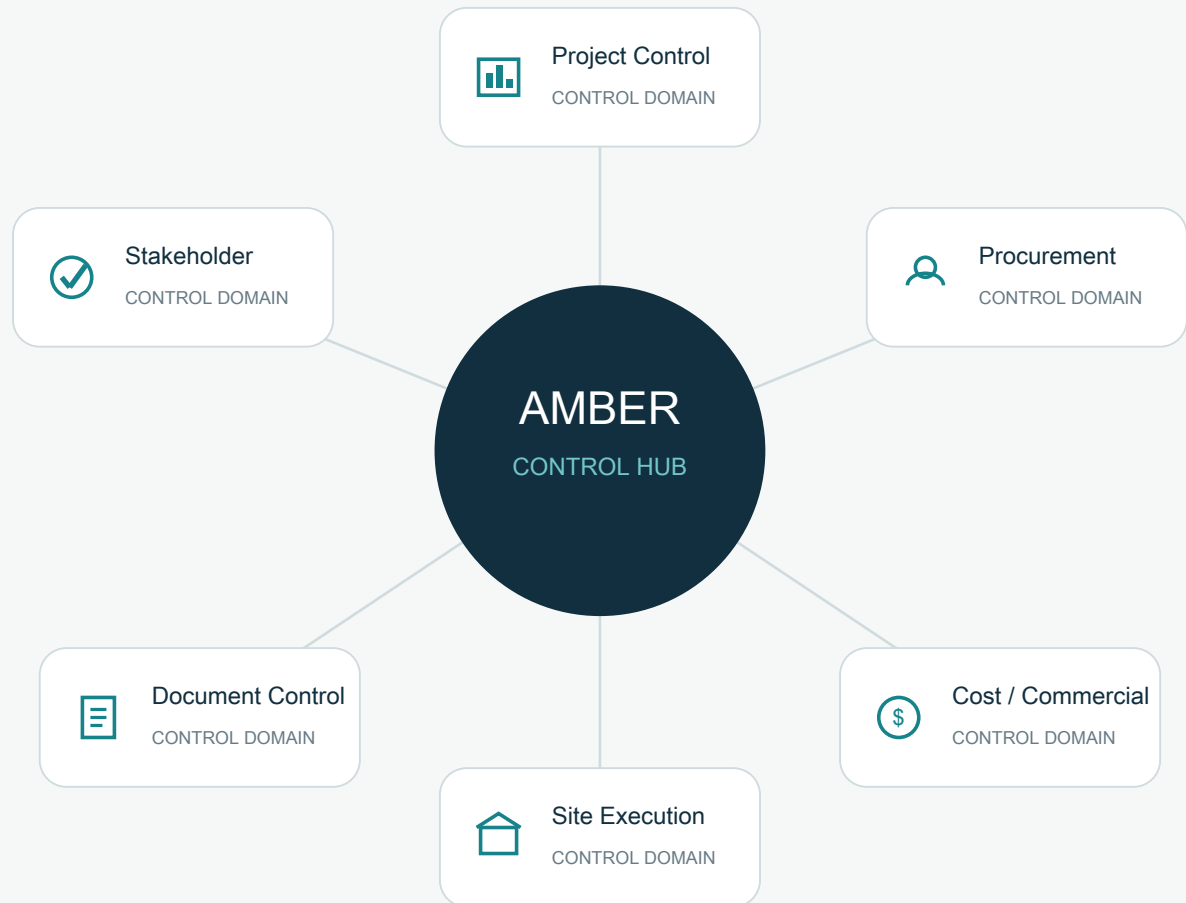

Framework + Evidence + Decision + Result

六個控制面向，共同支撐一個可交付的專案

不是工作分類，而是資訊、決策與風險彼此連動的管理系統

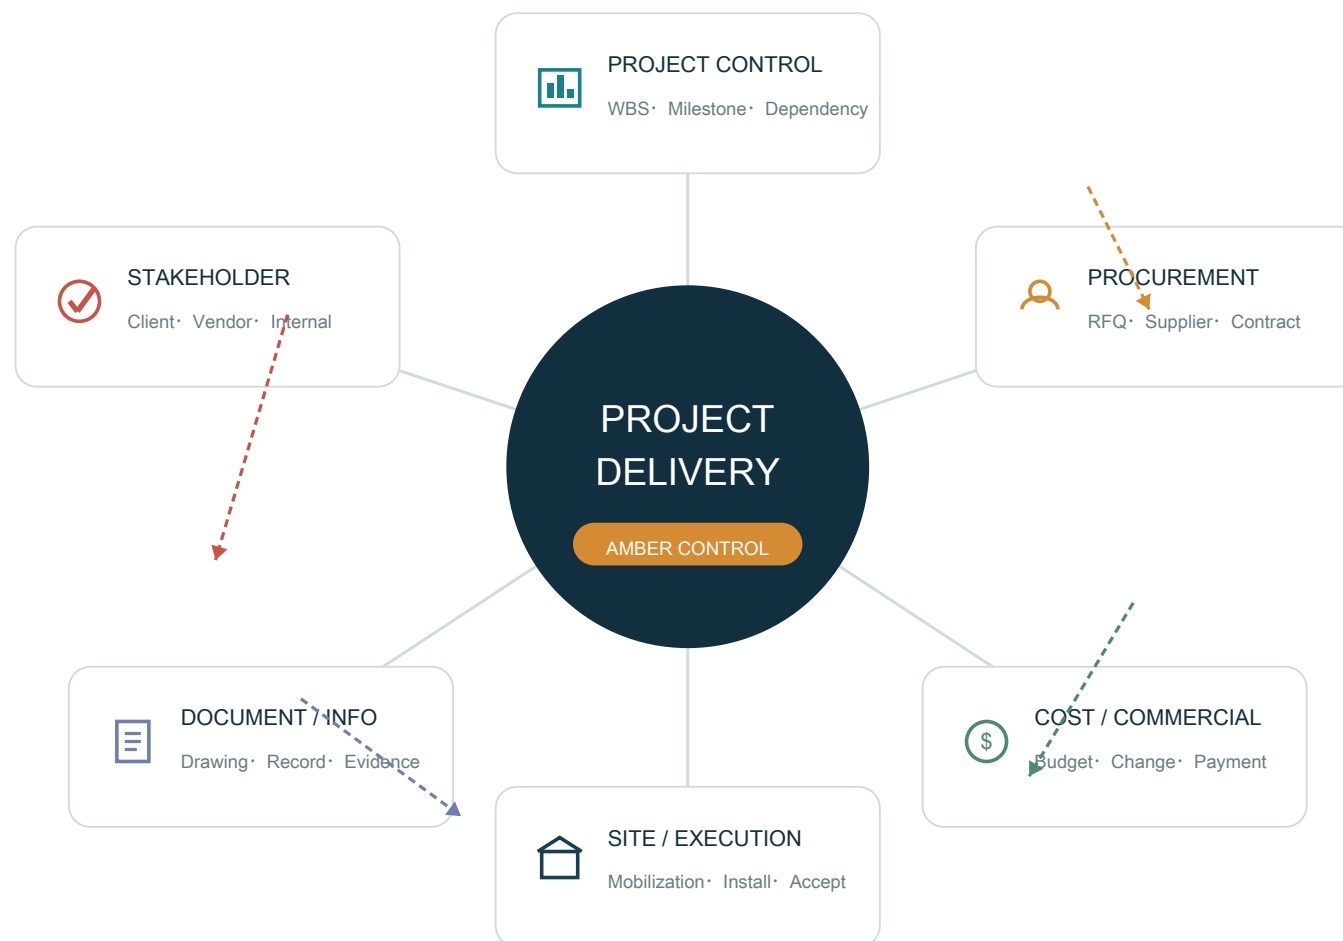

管理邏輯

- 時間**
里程碑延遲會改變採購、進場與付款節點
 - 風險**
規格、交期、現場介面與供應商履約相互放大
 - 判斷**
將資訊差異轉成需核准、需協調或需升級的事項
 - 證據**
圖面、報價、會議、照片、驗收與付款形成追溯鏈
- 我的角色**
跨面向整合、設定控制點、提出判斷、推進到關閉。

從需求到結案，每個節點都會改變下游條件


實線 = 交付前後置關係 | 虛線 = 資訊回饋 / 變更影響 | 橘色 = Amber 決策或控制點



把「催進度」改造成可預警、可分責、可升級的控制系統

WBS 定義工作 | Milestone 管理承諾 | Issue Log 讓差異進入閉環

CONTROL LOOP

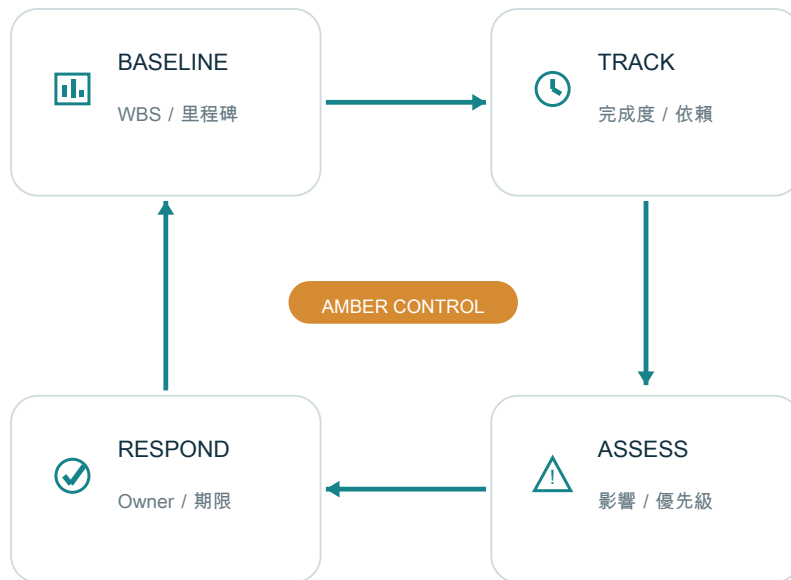

ESCALATION RULE

資訊差異 → 影響判斷 → 指派 Owner → 期限追蹤 →
需要主管決策時升級 → 關閉並保留證據





代表情境 自動化倉儲設備 輸送設備復機 鋼構平台 機電工程

類型	事實 / 差異	可能影響	責任窗口	下一步	狀態
範圍	圖面與報價項目定義不一致	漏項 / 追加 / 責任爭議	需求端 + 供應商	確認交付界面並形成紀錄	確認中
時程	關鍵材料未於進場節點	施工順序與整體工期影響	供應商 + 現場	提出替代排程與每日更新	追蹤中
介面	設備條件與現場空間資訊不同步	重工 / 待工 / 安全風險	設計 + 現場	現勘、標示差異、確認責任	待決策
變更	新增需求尚未連動成本與核准	預算與付款依據不一致	專案端 + 財務	補齊變更理由、金額與核准	已閉環

EVIDENCE 02 | Issue Log / Owner / Due Date

採購不是下單；核心是讓需求、選擇與履約條件一致

每個 Gate 都有輸入、判斷與證據，避免把風險延後到現場



COST DECISION WORKPAPER

不是把最低價圈起來，而是先把可比較的基準做出來

NT\$4M+
單一專案成本改善

項目	屬性	方案 A	方案 B	方案 C	差異判斷	決策
核心設備	必要	100	92	90	規格相符	保留
附屬材料	必要	100	84	82	範圍需澄清	折分比較
施工服務	必要	100	76	88	責任介面不同	重疊範圍
選配項目	可調	100	68	72	等效方案可行	替代
付款條件	商務	3段	2段	4段	完成度對應	調整節點
保固 / 保留	商務	12M	6M	12M	風險不同	納入總成本

註：成本僅以相對指數呈現，實際金額與供應商資料已曝光。

01 先固定不能改的需求 02 再拆設備、材料、施工與商務條件 03 驗證替代方案與原方案的介面 04 把決策寫回合約，變更與付款基準

MY DECISION / ACTION

- ✓ 拆解設備、材料、施工與服務範圍
- ✓ 確認比較基準，避免只看總價
- ✓ 將付款、工期、保固與責任納入選擇
- ✓ 保留核准依據，降低履約追加與爭議

RESULT

單一專案成本改善 NT\$4M+

EVIDENCE | 匿名化報價拆解與供應商比較

工程完成不等於可以付款；商務條件必須與交付證據相互核對

合約承諾 × 實際完成 × 驗收證據 × 請款內容




AMBER CONTROL POINTS

Contract	範圍、單價、付款與保固條件
Progress	現場完成度與里程碑
Evidence	驗收、照片、會議與變更核准
Payment	金額、稅額、保留款與附件
Closing	未結項、缺件與追溯軌跡

把不同立場收斂成同一個可執行版本

誰提供輸入、誰做決策、誰執行、誰驗證，都必須清楚

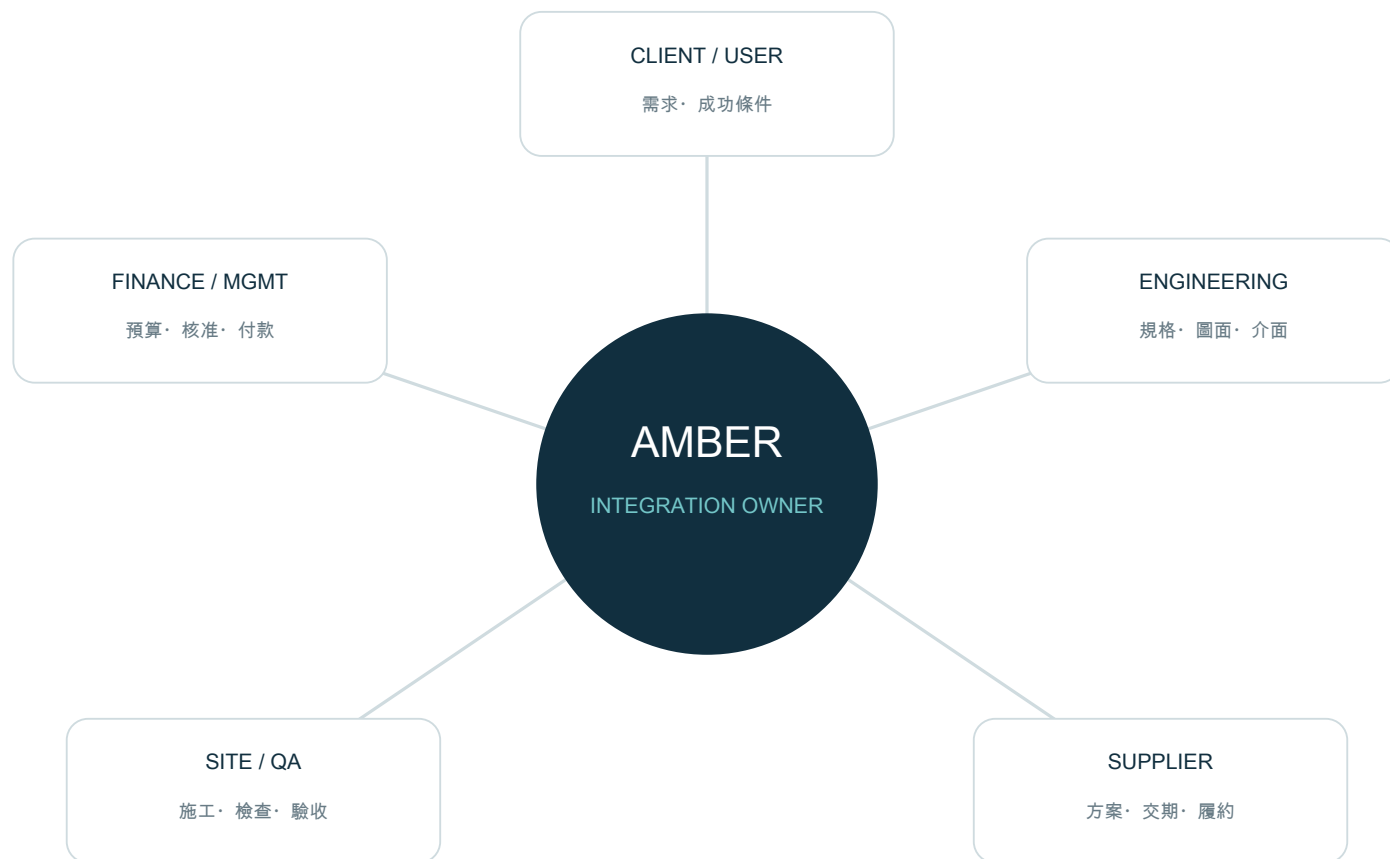

RESPONSIBILITY MAP

- 1 **INPUT**
需求、圖面、報價、現場狀態
- 2 **ALIGN**
版本、責任、期限、成功條件
- 3 **DECIDE**
差異、替代方案、風險與取捨
- 4 **ACT**
Owner、下一步與完成期限
- ✓ **VERIFY**
Evidence、驗收、付款與關閉

DECISION STANDARD

先釐清事實與影響，再決定協調、升級或變更。

管理框架必須能被真實工作證據驗證

以下三組證據均為實際工作邏輯的匿名化重建

COST DECISION

報價拆解 / 供應商比較

WORKPAPER

把報價圈起來，而是先把可比較的基準做出來

項目	屬性	方案 A	方案 B	方案 C	差異判斷	決策
必要	必要	100	92	90	價格相符	保留
必要	必要	100	84	82	範圍需溝通	所分比較
必要	必要	100	76	88	價格介面不同	重新範圍
可調	可調	100	68	72	等值方案可行	替代
商務	商務	3段	2段	4段	完成度對應	調整節點
商務	商務	12M	6M	12M	風險不同	納入總成本

需求時，實地全盤與供應商資料已備出。

改的需求

再與設備、材料、施工與商務條件

驗證替代方案與風險的介置

和決出預算與合約、變更與付款憑據

MY ACTION

拆解範圍與成本條件，提出可落地替代方案。

RESULT

NT\$4M+ 成本改善

PROJECT CONTROL

Milestone / Issue Log

DELIVERY CONTROL

被看見，才有機會在現場前被處理

TRACE / 相對情況

澄清
提高透明度
交付
交付 / 結案

方案、節點、責任、下一步

已確認事項	待辦事項	責任窗口	下一步	狀態
需求與報價條件下一版	需求 / 澄清 / 責任明確	需求方、供應商	確認交付多點至管理決定	確認
設備材料與設計清單更新	施工標準與設備工程	供應商、現場	替代設備與更新清單	追蹤
設備條件與現場條件下開步	施工 / 停工 / 安全風險	設計、現場	風險、標準差異、確認責任	停步
新增需求與變更成本核算	變更設計與估價下一版	管理層、財務	確認理由、金額與影響	已辦

MY ACTION

辨識依賴與下游影響，指派 Owner 並追蹤關閉。

RESULT

降低遺漏與資訊落差

COMMERCIAL CLOSE

PO / GR / IR 核對

CL CLOSURE + ERP READINESS

現場留下的事實，轉成系統裡可核對的紀錄

ACT / PO CONTROL

待審核 | 匿名化重製

控制項	已留下的相對證據	狀態
範圍	設備、材料、施工內容分項	已審核
條款	資料、清單、圖說、驗收	已核對
條件	原由、金額、責任、稅務成本	待核
條件	完成度、保留款、必要附件	待核對

1. 再 / 審核 → 2. 核對證據 → 3. 現場成本 → 4. 付稅憑據

RECONCILIATION

付款前，三份證據要對得起來

1. PO / 合約
我清楚範圍條件
2. GR / 驗收
完成度與變更紀錄
3. IR / 發票
金額、稅額與附件

一致則放行 | 差異則標示、追蹤與追蹤

LTO-PAY CROSSWALK

需求 / PR	詢價 / RFQ	PO / 合約	GR / 驗收	IR / 發票	付款 / 結案
需求、預算	詢價、報價、比較	價格、條件、版本	設備、施工、完成度	金額、稅額、附件	保留款、商標、票

位元系統與中台、進入審核流，以公開透明、主權、狀態與內外溝通為準。

MY ACTION

核對合約、完成度、證據與請款，保留追溯軌跡。

RESULT

可核對、可驗收、可結案

我能接住的不是單一任務，而是一條完整的交付鏈

Project Delivery 為主軸；Procurement、Commercial 與 Process Control 為專業深度

HIRING MANAGER SHOULD SEE



複雜拆解

把專案需求拆成工作、里程碑、採購、執行與結案條件。



關係管理

看見前後置依賴、跨部門責任與下游影響。



商務判斷

比較成本、付款、交期、保固、責任與履約風險。



交付控制

將 Issue、Change、Acceptance、Payment 形成閉環。

TARGET ROLES

Project Coordinator / PMO / 專案採購 /
設備與工程採購 / 供應商管理 / 流程改善

